

Conferința „Creșterea absorbției fondurilor structurale si de coeziune”

Implementarea proiectelor in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Pitești



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.regio.adrmuntentia.ro

www.inforegio.ro



H.G.R. nr. 998/2008 - Municipiul Pitești - Pol de Dezvoltare Urbană

❖ alocare 38,8 mil. Euro





❖ 11.11.2009 - depunere "Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești"

❖ 12 cereri de finantare incluse în PIDU, cu o valoare totală de 244,30 mil lei (54,17 mil euro), din care asistenta financiară nerambursabilă solicitată 185,84 mil lei (41,20 mil euro)

LA DATA DE 14.02.2013 S-A FINALIZAT PROCESUL DE CONTRACTARE PENTRU TOATE CELE 12 CERERI DE FINANTARE





www.regio.adrmuntentia.ro


www.inforegio.ro

   							
Nr. crt.	Numar contract	Data semnarii	Titlu proiect	Valoare totală	Asistența nerambursabilă solicitată (FEDR+buget național)	Durată - nr. luni-	Stadiu
				- lei -	- lei -		
1	1218	20.01.2011	Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona: Podul Viilor - Parc Strand din municipiul Pitești	3.501.934,57 lei	2.266.494,01 lei	39	In implementare
2	1217	20.01.2011	Creare Parc Lunca Argeșului	40.592.065,25 lei	19.072.158,85 lei	22	Finalizat
3	2289	23.09.2011	Modernizare Pod Argeș	12.675.130,55 lei	8.878.668,92 lei	33	In implementare
4	2769	29.12.2011	Modernizare Pod peste Râul Doamnei, Pitești	4.082.072,15 lei	3.105.204,72 lei	21	In implementare
5	2759	30.12.2011	Modernizare parcare Bowling în Municipiul Pitești	3.429.749,05 lei	2.517.767,24 lei	17	In implementare
6	2984	13.03.2012	Modernizare parc strand	6.953.684,08 lei	5.305.283,45 lei	21	In implementare
7	3387	25.09.2012	Modernizare iluminat public în zona Podul Viilor - Calea Campulung	1.752.689,16 lei	1.382.927,98 lei	11	In implementare
8	3391	25.09.2012	Modernizare străzi Lănăriei, Târgul din Vale, Costache Negri, din Municipiul Pitești	18.815.828,00 lei	14.864.551,80 lei	18	In implementare
9	3628	29.01.2013	Modernizare strazi zona II Calea Campulung	4.335.258,58 lei	3.437.224,10 lei	28	In implementare
10	3615	29.01.2013	Realizare Centru Multifunctional	17.304.217,88 lei	6.943.763,51 lei	28	In implementare
11	3653	14.02.2013	PROIECT URBAN - Reabilitare infrastructura urbana în Municipiul Pitești	89.986.078,70 lei	86.066.787,11 lei	25	In implementare
12	3658	14.02.2013	Pasaj rutier Podul Viilor din Municipiul Pitești	40.868.230,72 lei	31.999.700,88 lei	23	In implementare

www.regio.adrmuntentia.ro


www.inforegio.ro



www.regio.adrmuntentia.ro

www.inforegio.ro

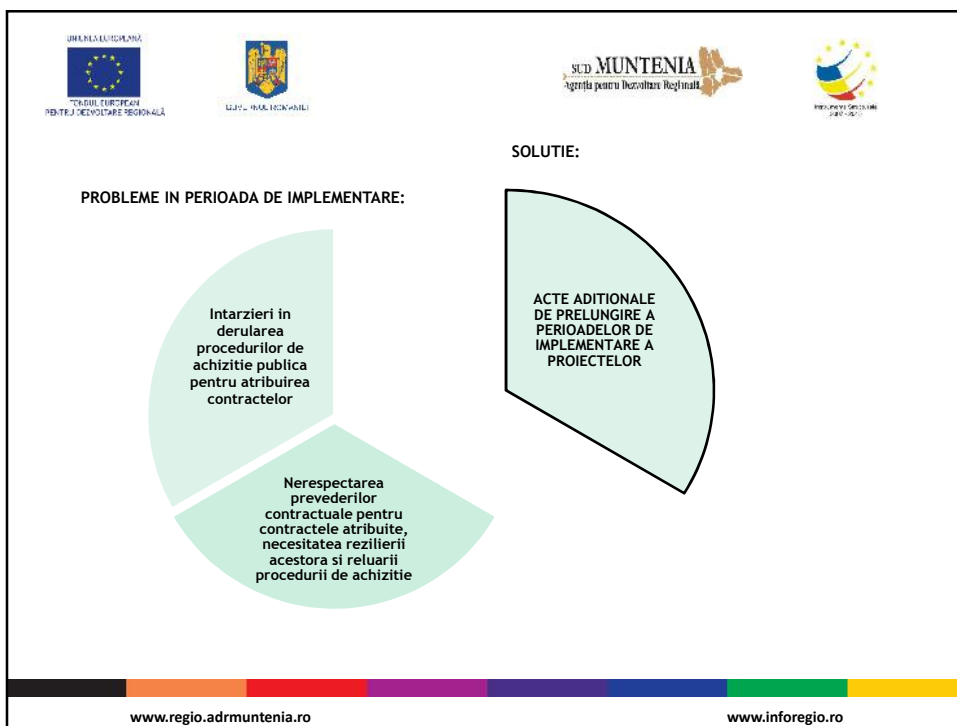


UNIUNEA EUROPEANĂ
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ


ROMANIA
GUVERNUL ROMÂNIEI


SUD MUNTENIA
Agencia pentru Dezvoltare Regională


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR (1)

Nr. crt.	Numar contract	Data semnării	Titlu proiect	Grad de realizare	Stadiul implementării
1	1218	20.01.2011	Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona: Podul Viilor- Parc Strand din municipiul Pitești	60%	Au fost finalizate următoarele achiziții: -servicii de publicitate -servicii de management proiect -servicii de dirigentie de santier -servicii de audit A fost semnat contractul de achiziție a sistemului de supraveghere în data de 07.11.2012, însă datorită neîndeplinirii clauzelor contractuale de către furnizor, contractul a fost reziliat. Au fost făcute modificări ale PT-ului, acestea fiind depuse spre avizare la ADR SM, urmând a se relua procedura de achiziție.
2	2289	23.09.2011	Modernizare Pod Arges	45%	Au fost finalizate toate achizițiile prevăzute în proiect. Stadiul execuției de lucrări aproximativ 10 %
3	2769	29.12.2011	Modernizare Pod peste Râul Doamnei, Pitești	25%	Au fost finalizate toate achizițiile prevăzute în proiect. Lucrările au fost realizate în proporție de 2%.
4	2759	30.12.2011	Modernizare parcare Bowling în Municipiul Pitești	50%	Au fost finalizate toate achizițiile prevăzute în proiect. Lucrările au fost demarate în baza ordinului de începere emis în data de 14.09.2012, efectuându-se lucrări în proporție de 45 %.
5	2984	13.03.2012	Modernizare parc strand	17%	Au fost finalizate următoarele achiziții : - achiziția serviciilor de management de implementare a proiectului - achiziția serviciilor de publicitate - achiziția serviciilor de audit Achiziția execuției de lucrări nu a fost încă publicată pe SEAP deoarece a fost modificat PT-ul care a fost depus la ADR SM spre avizare.
6	3387	25.09.2012	Modernizare iluminat public în zona Podul Viilor - Calea Campulung	13%	Au fost finalizate următoarele achiziții : - achiziția serviciilor de publicitate - achiziția serviciilor de audit Procedura pt achiziția de lucrări a fost anulată.

www.regio.adrmuntentia.ro
www.inforegio.ro

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR (2)

Nr. crt.	Numar contract	Data semnării	Titlu proiect	Grad de realizare	Stadiul implementării
7	3391	25.09.2012	Modernizare străzi Lănăriei, Târgul din Vale, Costache Negri din Municipiul Pitesti	15%	Au fost încheiate contractele de: - servicii de consultanță - audit - informare și publicitate - dirigentie de șantier Achiziția de executie lucrări se afla în etapa de evaluare a ofertelor.
8	3628	29.01.2013	Modernizare strazi zona II Calea Campulung	5%	Au fost finalizate urmatoarele achizitii: - achiziția serviciilor de management de implementare a proiectului - achiziția serviciilor de publicitate Achiziția executiei de lucrări este în desfasurare.
9	3615	29.01.2013	Realizare Centru Multifunctional	5%	Sunt în desfasurare achizitiile de: -servicii de management -servicii de informare și publicitate Se afla în pregătire documentatia de atribuire pentru achiziția de executie lucrări.
10	3653	14.02.2013	PROIECT URBAN - Reabilitare infrastructura urbana în Municipiul Pitesti	5%	Sunt în desfasurare achizitiile de: -servicii de management -servicii de informare și publicitate Se afla în pregătire documentatia de atribuire pentru achiziția de executie lucrări.
11	3658	14.02.2013	Pasaj rutier Podul Viilor din Municipiul Pitesti	2%	Achizițiile prevăzute în proiect sunt în curs de desfasurare.

www.regio.adrmuntentia.ro

www.inforegio.ro

CREARE PARC LUNCA ARGESULUI

Proiect finalizat în 20.11.2012

Valoare totala a rambursărilor efectuate:
12.443.563,40 lei

Numar cereri rambursare: 8,
în perioada 29.04.2011 si 03.01.2013

Lucrări și amenajări realizate:

- Amenajare - Piațeta Intrare
- Fântâni arteziene: una pietonală și una dinamică
- Discoteca în aer liber / pe timpul iernii patinoar - 2000mp
- Teatrul în aer liber - utilizări multiple în funcție de sezon și de evenimente: teatru, zona de agrement, expoziție - artă - sculptură - 2000 mp
- Amenajare baza sportivă: 2 terenuri de tenis de câmp și două terenuri multifuncționale- minifotbal și baschet.
- Amenajare locuri de joacă
- Zonă pentru șahiști: 14 ansambluri de mese de șah + scaune; Foișoare-6 bucăți; Pergole - 19 bucăți
- Pe malul raului Argeș: 20 platforme belvedere - locuri pentru pescuit, cu bănci și coșuri de depozitare deșeuri
- Piste de biciclete, alei carosabile și pietonale
- Mobilier (banci, cosuri de gunoi)
- Grupuri sanitare tradiționale
- Parcare: 70 locuri în parcare ecologică
- Împrejmuire parc - gard compus din fundație, soclu și stâlpi confectionati din beton armat si plăci din fier forjat
- Amenajare peisagistică au fost plantați peste 7000 bucăți arbori și arbuști ornamentali și peste 2000 bulbi de lălea
- Alimentarea cu apă potabilă, grupuri sanitare, ciselele cu apa si pentru stropitul spațiilor verzi
- Cabina de pază, sistem de monitorizare a parcului cu camere de supravegere video
- Împrejmuirea intregului parc



www.regio.adrmuntentia.ro

www.inforegio.ro




Creare Parc Lunca Argeșului

Vizita precontractare: 09.12.2010



www.regio.adrmuntentia.ro

www.inforegio.ro

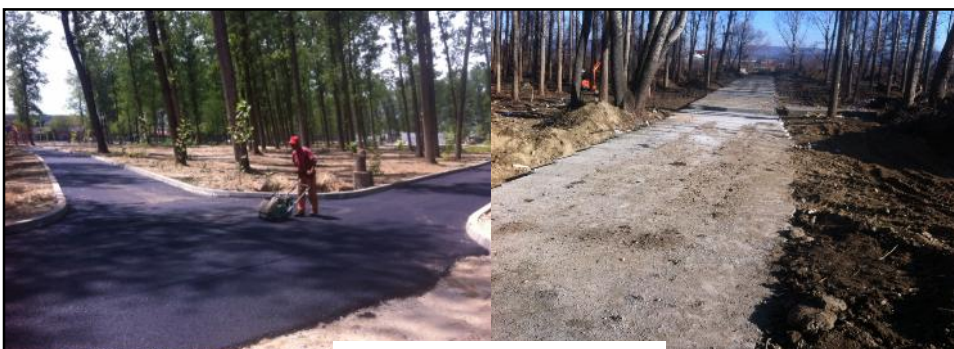

Implementare: 20.01.2011 – 20.11.2012



www.regio.adrmuntentia.ro

www.inforegio.ro





Vă mulțumim pentru atenție!

LIVIU MUȘAT, Director

Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA
Str. General Constantin Pantazi, nr.7A, CĂLĂRAȘI
Telefon 0242 – 331 769
Fax 0342 – 108 001
E-mail: office@adrmuntentia.ro
Website : www.adrmuntentia.ro

Investim în viitorul tău!
 Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat
 de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare
 Regională



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.regio.adrmuntentia.ro www.inforegio.ro
